Projektnr. 02066grm13
Auftragg. Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Projekttitel Ausbau Reichenbach in Merzhausen

Zeitplan **Stand August 2020**
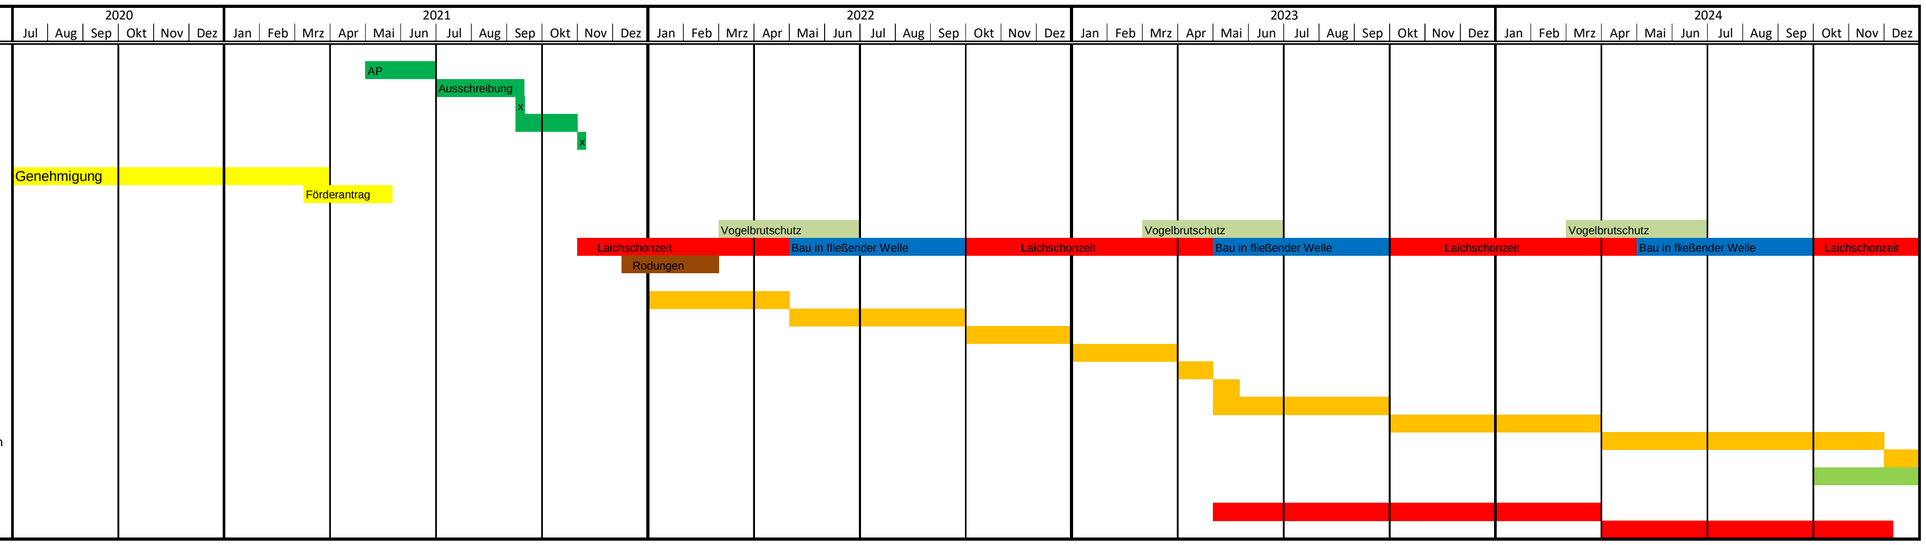
Position	Arbeitsschritte
1	**Planung**
1.2	Ausführungsplanung
1.3	Ausschreibung
1.4	Submission
1.5	Mitwirken bei der Vergabe
1.6	Vergabetermin
2	**Behörden**
2.1	Genehmigung LRA
2.2	Förderantrag RP
3	**Zeitliche Zwangspunkte**
3.1	Vogelbrutschutz
3.2	Fischlaichzeit
5	**Bauarbeiten**
5.1	Baumfällarbeiten
5.2	Gehweg Schlossweg - Inselweg
5.3	Bachbett Inselweg bis Sauermatten
5.4	Abbruch Überplattung Radschuppen Sütterlin
5.5	Mauererhöhungen Flst. 756 und 195/7
5.6	Aufkantung Brücke Sütterlin, Abdichtung Flst 754
5.7	Errichtung Rampe als Abfahrt Flst 756
5.8	Bachbett Sauermatten bis Brücke Sütterlin
5.9	Restarbeiten Uferbereiche
5.10	Abbruch und Wiederherstellung Brücke Sauermatten
5.11	Anschlussarbeiten an neuer Brücke Sauermatten
5.12	Pflanzarbeiten
6	**Sperrung in dern Sauermatten**
6.1	halbseitige Sperrung
6.2	Vollsperrung
